REFORMA GERAL 2023FÓRUM ELEITORAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Data início	Prazo total (Dias)
01/04/2023	82

	Tarefa	Valor (R$)	Início previsto	Predecessora	Término previsto	Duração prevista	Dias não trabalhados	Duração Real	Início Real	Término Real	Descrição
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.710,96	01/04/2023		01/04/2023	1	0	0			
2	LIXEIRA	R$ 303,52	04/06/2023	9	06/06/2023	2	1	0			
3	ACESSIBILIDADE EXTERNA	R$ 69.824,32	18/05/2023	8	08/06/2023	19	3	0			
4	ACESSIBILIDADE INTERNA	R$ 5.096,60	23/06/2023	16	26/06/2023	3	1	0			
5	SANITÁRIOS ACESSÍVEIS	R$ 7.063,20	27/06/2023	4	04/07/2023	7	1	0			
6	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	R$ 2.921,59	09/06/2023	3	11/06/2023	2	1	0			
7	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 39.506,21	16/04/2023	10	10/05/2023	21	4	0			
8	GRADIL DA FACHADA	R$ 6.126,92	11/05/2023	7	17/05/2023	6	1	0			
9	MUROS DE DIVISA	R$ 34.511,36	11/05/2023	7	03/06/2023	21	3	0			
10	COBERTURA	R$ 27.989,59	02/04/2023	1	15/04/2023	12	2	0			
11	FORRO	R$ 7.640,45	23/06/2023	16	29/06/2023	6	1	0			
12	TOLDOS (C.A.E., DEP. DE URNAS E COPA)	R$ 29.326,63	29/04/2023	14	02/05/2023	3	1	0			
13	DRENOS DO AR CONDICIONADO	R$ 949,03	09/06/2023	3	12/06/2023	3	1	0			
14	JANELAS	R$ 32.388,76	16/04/2023	10	28/04/2023	11	2	0			
15	PORTAS E PORTÕES	R$ 2.319,92	29/06/2023	18	03/07/2023	4	1	0			
16	ESTANTES DO DEPÓSITO DE URNAS	R$ 1.945,10	15/06/2023	19	22/06/2023	7	1	0			
17	PISO (CERÂMICO GERAL E DEPÓSITO DE URNAS)	R$ 3.016,56	15/06/2023	19	21/06/2023	6	1	0			
18	ELETRICA E REDE	R$ 4.785,09	23/06/2023	16	28/06/2023	5	1	0			
19	INFILTRAÇÕES EM ALVENARIA	R$ 2.572,54	13/06/2023	13	14/06/2023	2	0	0			
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 11.825,91	04/07/2023	15	10/07/2023	6	1	0			
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 17.269,11	01/04/2023		10/07/2023	100	15	0			
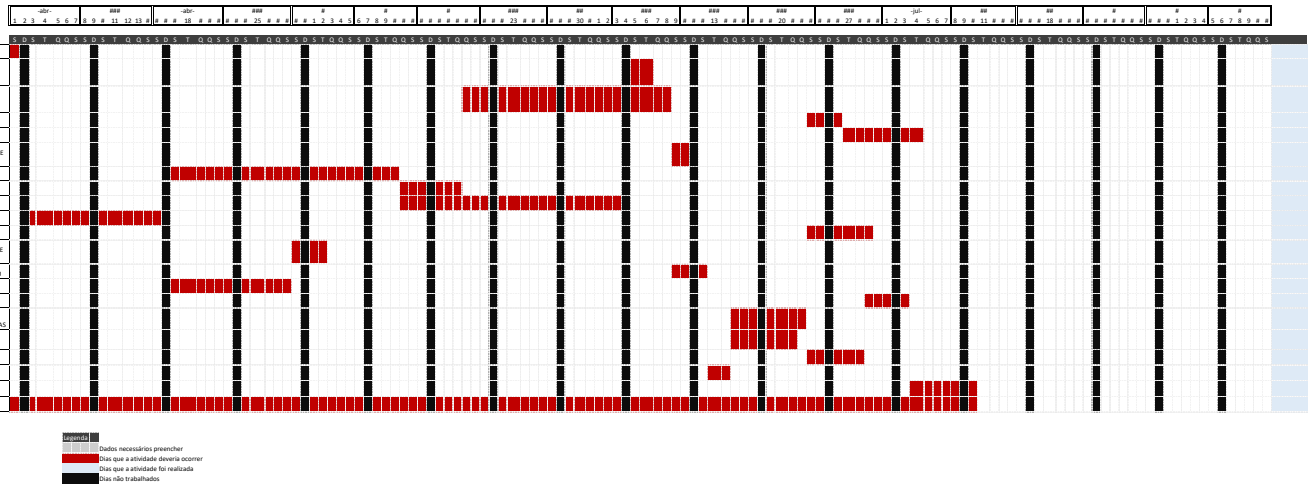
REFORMA GERAL 2023FÓRUM ELEITORAL DE CRUZEIRO DO OESTE
